
Planificación de construcción — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

Análisis de Sistemas II · Universidad Mariano Gálvez, Mazatenango · Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789 · Herramienta: Microsoft Project · Corte al 28 de octubre de 2026

6 oct – 4 nov 2026	168 h	156 h (93 %)	16 de 19	4 de 5
periodo	planificadas (6 h diarias)	ejecutadas	tareas completadas	hitos alcanzados

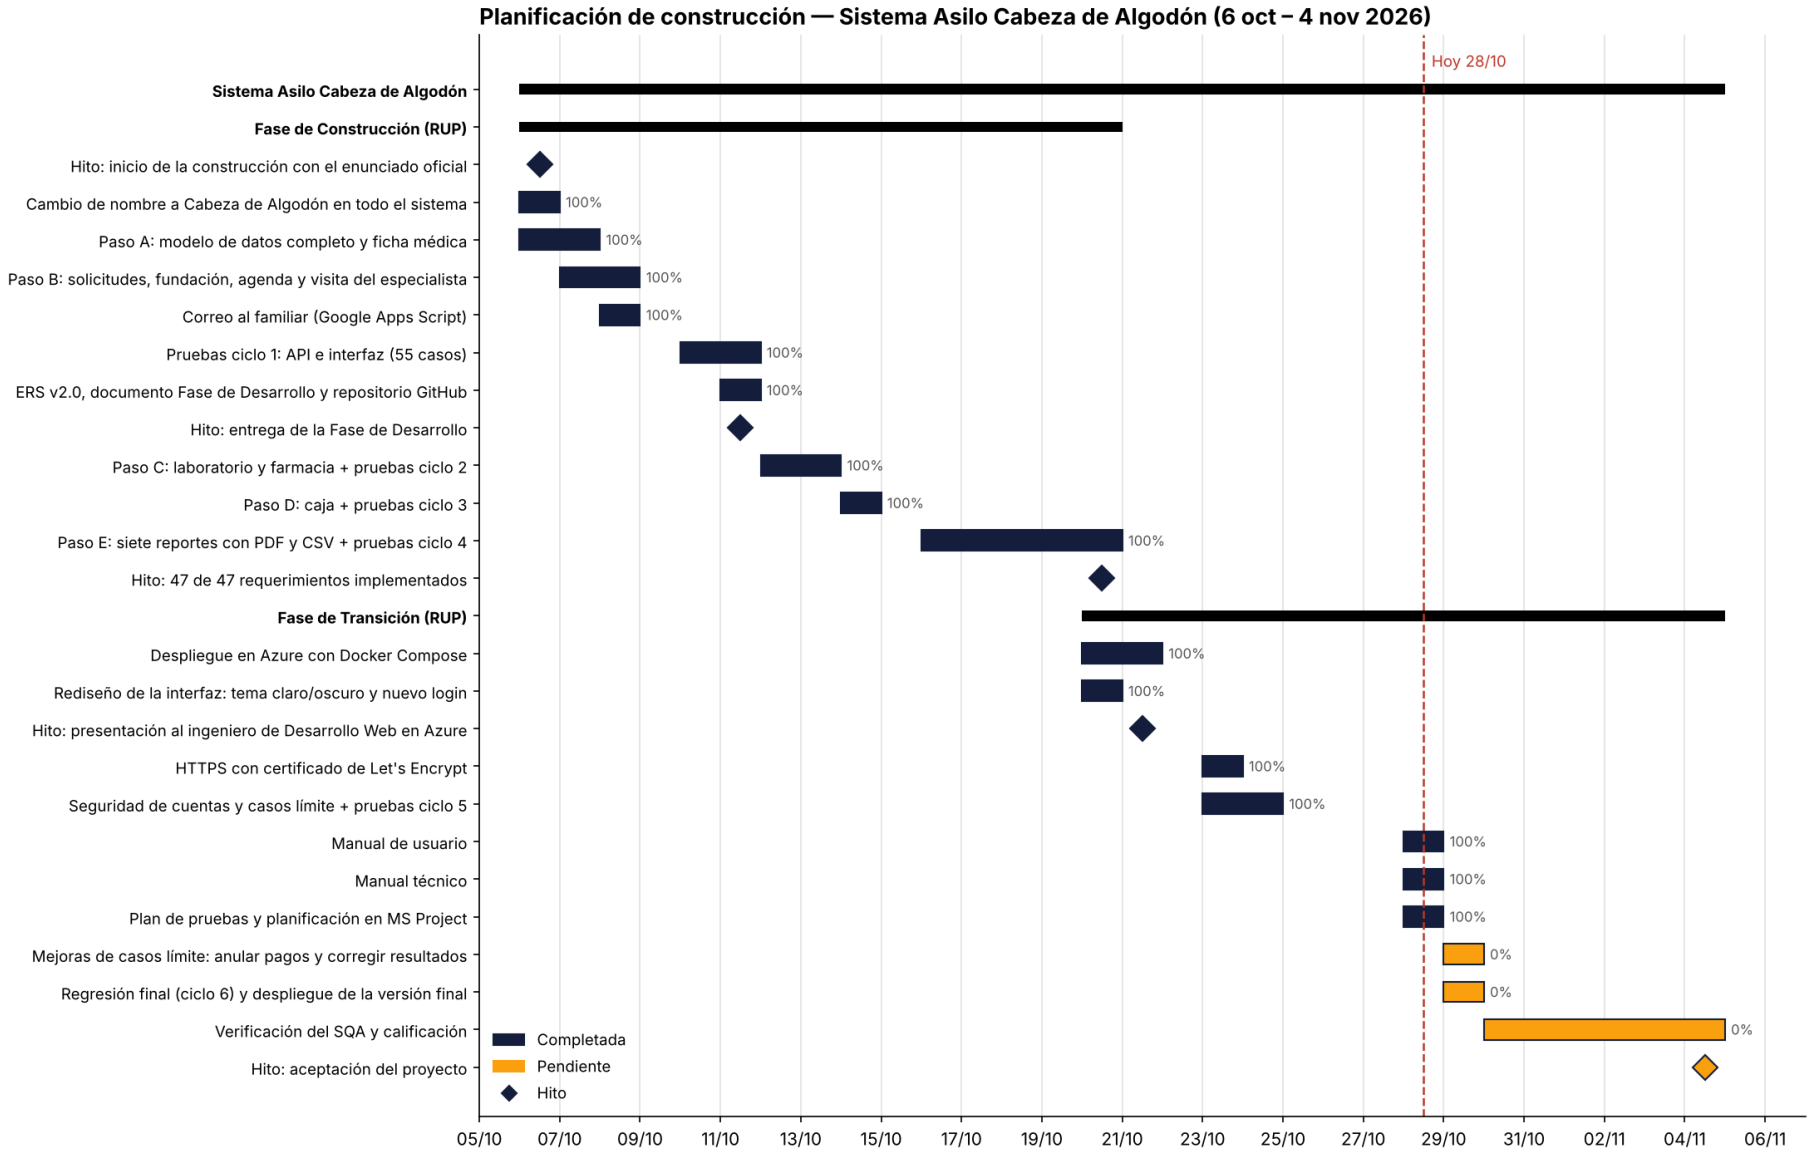

Tareas

#	Tarea	Inicio	Fin	Días	Horas	Recurso	Avance
	Sistema Asilo Cabeza de Algodón						
	Fase de Construcción (RUP)						
3	◆ Hito: inicio de la construcción con el enunciado oficial	6 oct	6 oct	0	—	—	100 %
4	Cambio de nombre a Cabeza de Algodón en todo el sistema	6 oct	6 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
5	Paso A: modelo de datos completo y ficha médica	6 oct	7 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
6	Paso B: solicitudes, fundación, agenda y visita del especialista	7 oct	8 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
7	Correo al familiar (Google Apps Script)	8 oct	8 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
8	Pruebas ciclo 1: API e interfaz (55 casos)	10 oct	11 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
9	ERS v2.0, documento Fase de Desarrollo y repositorio GitHub	11 oct	11 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
10	◆ Hito: entrega de la Fase de Desarrollo	11 oct	11 oct	0	—	—	100 %
11	Paso C: laboratorio y farmacia + pruebas ciclo 2	12 oct	13 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
12	Paso D: caja + pruebas ciclo 3	14 oct	14 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
13	Paso E: siete reportes con PDF y CSV + pruebas ciclo 4	16 oct	20 oct	5	30	Fredy Vásquez	100 %
14	◆ Hito: 47 de 47 requerimientos implementados	20 oct	20 oct	0	—	—	100 %
	Fase de Transición (RUP)						
16	Despliegue en Azure con Docker Compose	20 oct	21 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
17	Rediseño de la interfaz: tema claro/oscuro y nuevo login	20 oct	20 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
18	◆ Hito: presentación al ingeniero de Desarrollo Web en Azure	21 oct	21 oct	0	—	—	100 %
19	HTTPS con certificado de Let's Encrypt	23 oct	23 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
20	Seguridad de cuentas y casos límite + pruebas ciclo 5	23 oct	24 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
21	Manual de usuario	28 oct	28 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
22	Manual técnico	28 oct	28 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
23	Plan de pruebas y planificación en MS Project	28 oct	28 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
24	Mejoras de casos límite: anular pagos y corregir resultados	29 oct	29 oct	1	6	Fredy Vásquez	0 %
25	Regresión final (ciclo 6) y despliegue de la versión final	29 oct	29 oct	1	6	Fredy Vásquez	0 %
26	Verificación del SQA y calificación	30 oct	4 nov	6	12	SQA	0 %
27	◆ Hito: aceptación del proyecto	4 nov	4 nov	0	—	—	0 %
	Total del analista				**168**		**93 %**
